


Taaknaam	Begindatum	Duur	Einddatum	Voorafgaand taken	Opvolgende taken
1 RWZI Oijen	woe 1-9-21	221 d	vri 5-8-22		
2 Milestones PACAS	woe 1-9-21	221 d	vri 5-8-22		
3 Milestones	woe 1-9-21	221 d	vri 5-8-22		
4 Gunning	woe 1-9-21	0 d	woe 1-9-21		5;82;83
5 Start werkvoorbereiding	woe 1-9-21	0 d	woe 1-9-21	4	121;126;137;80
6 Start ondergrondse infra	woe 6-4-22	0 d	woe 6-4-22	317	
7 Start Civiel/bouwkundig	maa 18-10-21	0 d	maa 18-10-21	140;141;143;;	
8 Start werktuigbouwkundig	woe 9-2-22	0 d	woe 9-2-22	242	
9 Start elektrotechniek	don 3-2-22	0 d	don 3-2-22	118;98;56	311
10 Start gesloten seizoen primaire kering 2021	vri 1-10-21	119 d	don 31-3-22		172;331BE+1 d
11 Start broedseizoen 2022	din 15-3-22	0 d	din 15-3-22		
12 Wind en waterdicht	maa 31-1-22	0 d	maa 31-1-22	219	
13 Software beschikbaar	woe 23-3-22	0 d	woe 23-3-22	65GB	
14 Hardware gereed	woe 23-3-22	0 d	woe 23-3-22	178;292	
15 Uitvoering gereed	vri 15-7-22	0 d	vri 15-7-22	178;292;318;;16BE-40 d	
16 Opstellen TCD	woe 18-5-22	40 d	vri 15-7-22	15BE-40 d	17
17 Inleveren TCD	vri 15-7-22	0 d	vri 15-7-22	16	
18 Instructiedagen	woe 13-7-22	3 d	vri 15-7-22	72	
19 Oplevering Prognose	din 19-7-22	0 d	din 19-7-22	381;72	
20 Oplevering volgens bestek	vri 5-8-22	0 d	vri 5-8-22		21EB
21 Bouwtijd verkorting conform EMVI-plan	vri 10-6-22	8 wkn	vri 5-8-22	20EB	22EB
22 Oplevering EMVI-plan	vri 10-6-22	0 d	vri 10-6-22	21EB	
23 Milestones Slibverlading	woe 1-9-21	146 d	don 7-4-22		
24 Milestones	woe 1-9-21	146 d	don 7-4-22		
25 Gunning	woe 1-9-21	0 d	woe 1-9-21		26
26 start werkvoorbereiding	woe 1-9-21	18 wkn	woe 19-1-22	25	
27 start Civiel/bouwkundig	maa 18-10-21	0 d	maa 18-10-21		
28 start werktuigkundig	maa 29-11-21	0 d	maa 29-11-21		274
29 start electrotechniek	maa 10-1-22	0 d	maa 10-1-22		
30 tijdelijke slibontwatering	maa 7-2-22	8 wkn	vri 1-4-22		279GB
31 Hardware gereed	woe 9-3-22	0 d	woe 9-3-22	32GE-20 d	
32 Uitvoering gereed	woe 6-4-22	0 d	woe 6-4-22	281;376	34;31GE-20 d
33 Opstellen TCD	maa 7-3-22	20 d	vri 1-4-22		
34 Inleveren TCD	woe 6-4-22	0 d	woe 6-4-22	32	
35 Instructiedagen	woe 6-4-22	2 d	don 7-4-22		36
36 Oplevering Prognose	don 7-4-22	0 d	don 7-4-22	35	
37 Vergunningen	maa 1-3-21	100 d	vri 23-7-21		
38 Omgevingsvergunning voor de activiteit milieu	maa 1-3-21	8 wkn	din 27-4-21		39
39 Verlengen	woe 28-4-21	6 wkn	vri 11-6-21	38	40
40 Ter inzage	maa 14-6-21	6 wkn	vri 23-7-21	39	
41 Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen	maa 1-3-21	8 wkn	din 27-4-21		42
42 Verlengen	woe 28-4-21	6 wkn	vri 11-6-21	41	43
43 Ter inzage	maa 14-6-21	6 wkn	vri 23-7-21	42	
44 Watervergunning beschermingszone (keur)	maa 1-3-21	8 wkn	din 27-4-21		45
45 Verlengen	woe 28-4-21	6 wkn	vri 11-6-21	44	
46 Beproevingen en keuringen (PACAS)	din 28-9-21	193 d	vri 15-7-22		
47 Engineeringsfase	din 28-9-21	40 d	maa 22-11-21		
48 Toetsing E schema's	din 9-11-21	10 d	maa 22-11-21	146	147
49 Toetsing werktuigbouwkundig ontwerp	din 28-9-21	40 d	maa 22-11-21		
50 Pakket 1 (P&ID, samenstelling)	din 28-9-21	10 d	maa 11-10-21	149	106;107;109;110
51 Pakket 2 (details)	din 9-11-21	10 d	maa 22-11-21	150	101;108;111;112
52 Pakket 3 (elektra details)	maa 18-10-21	10 d	vri 29-10-21	152	
53 FAT	maa 24-1-22	32 d	din 8-3-22		
54 I/O test	maa 24-1-22	3 d	woe 26-1-22	118	55
55 Afname panelen	don 27-1-22	1 d	don 27-1-22	54	56
56 Verwerken punten uit de FAT	vri 28-1-22	5 d	don 3-2-22	55	311,9
57 Afname PACAS installatie	din 25-1-22	31 d	din 8-3-22		
58 Opslagsilo	din 8-3-22	1 d	din 8-3-22	102	244
59 Stoffilter	din 25-1-22	1 d	din 25-1-22		
60 Uitdraagapparatuur, instrumenten, L-I-W-feeders & Besturingsysteem Feeders	maa 7-2-22	1 d			

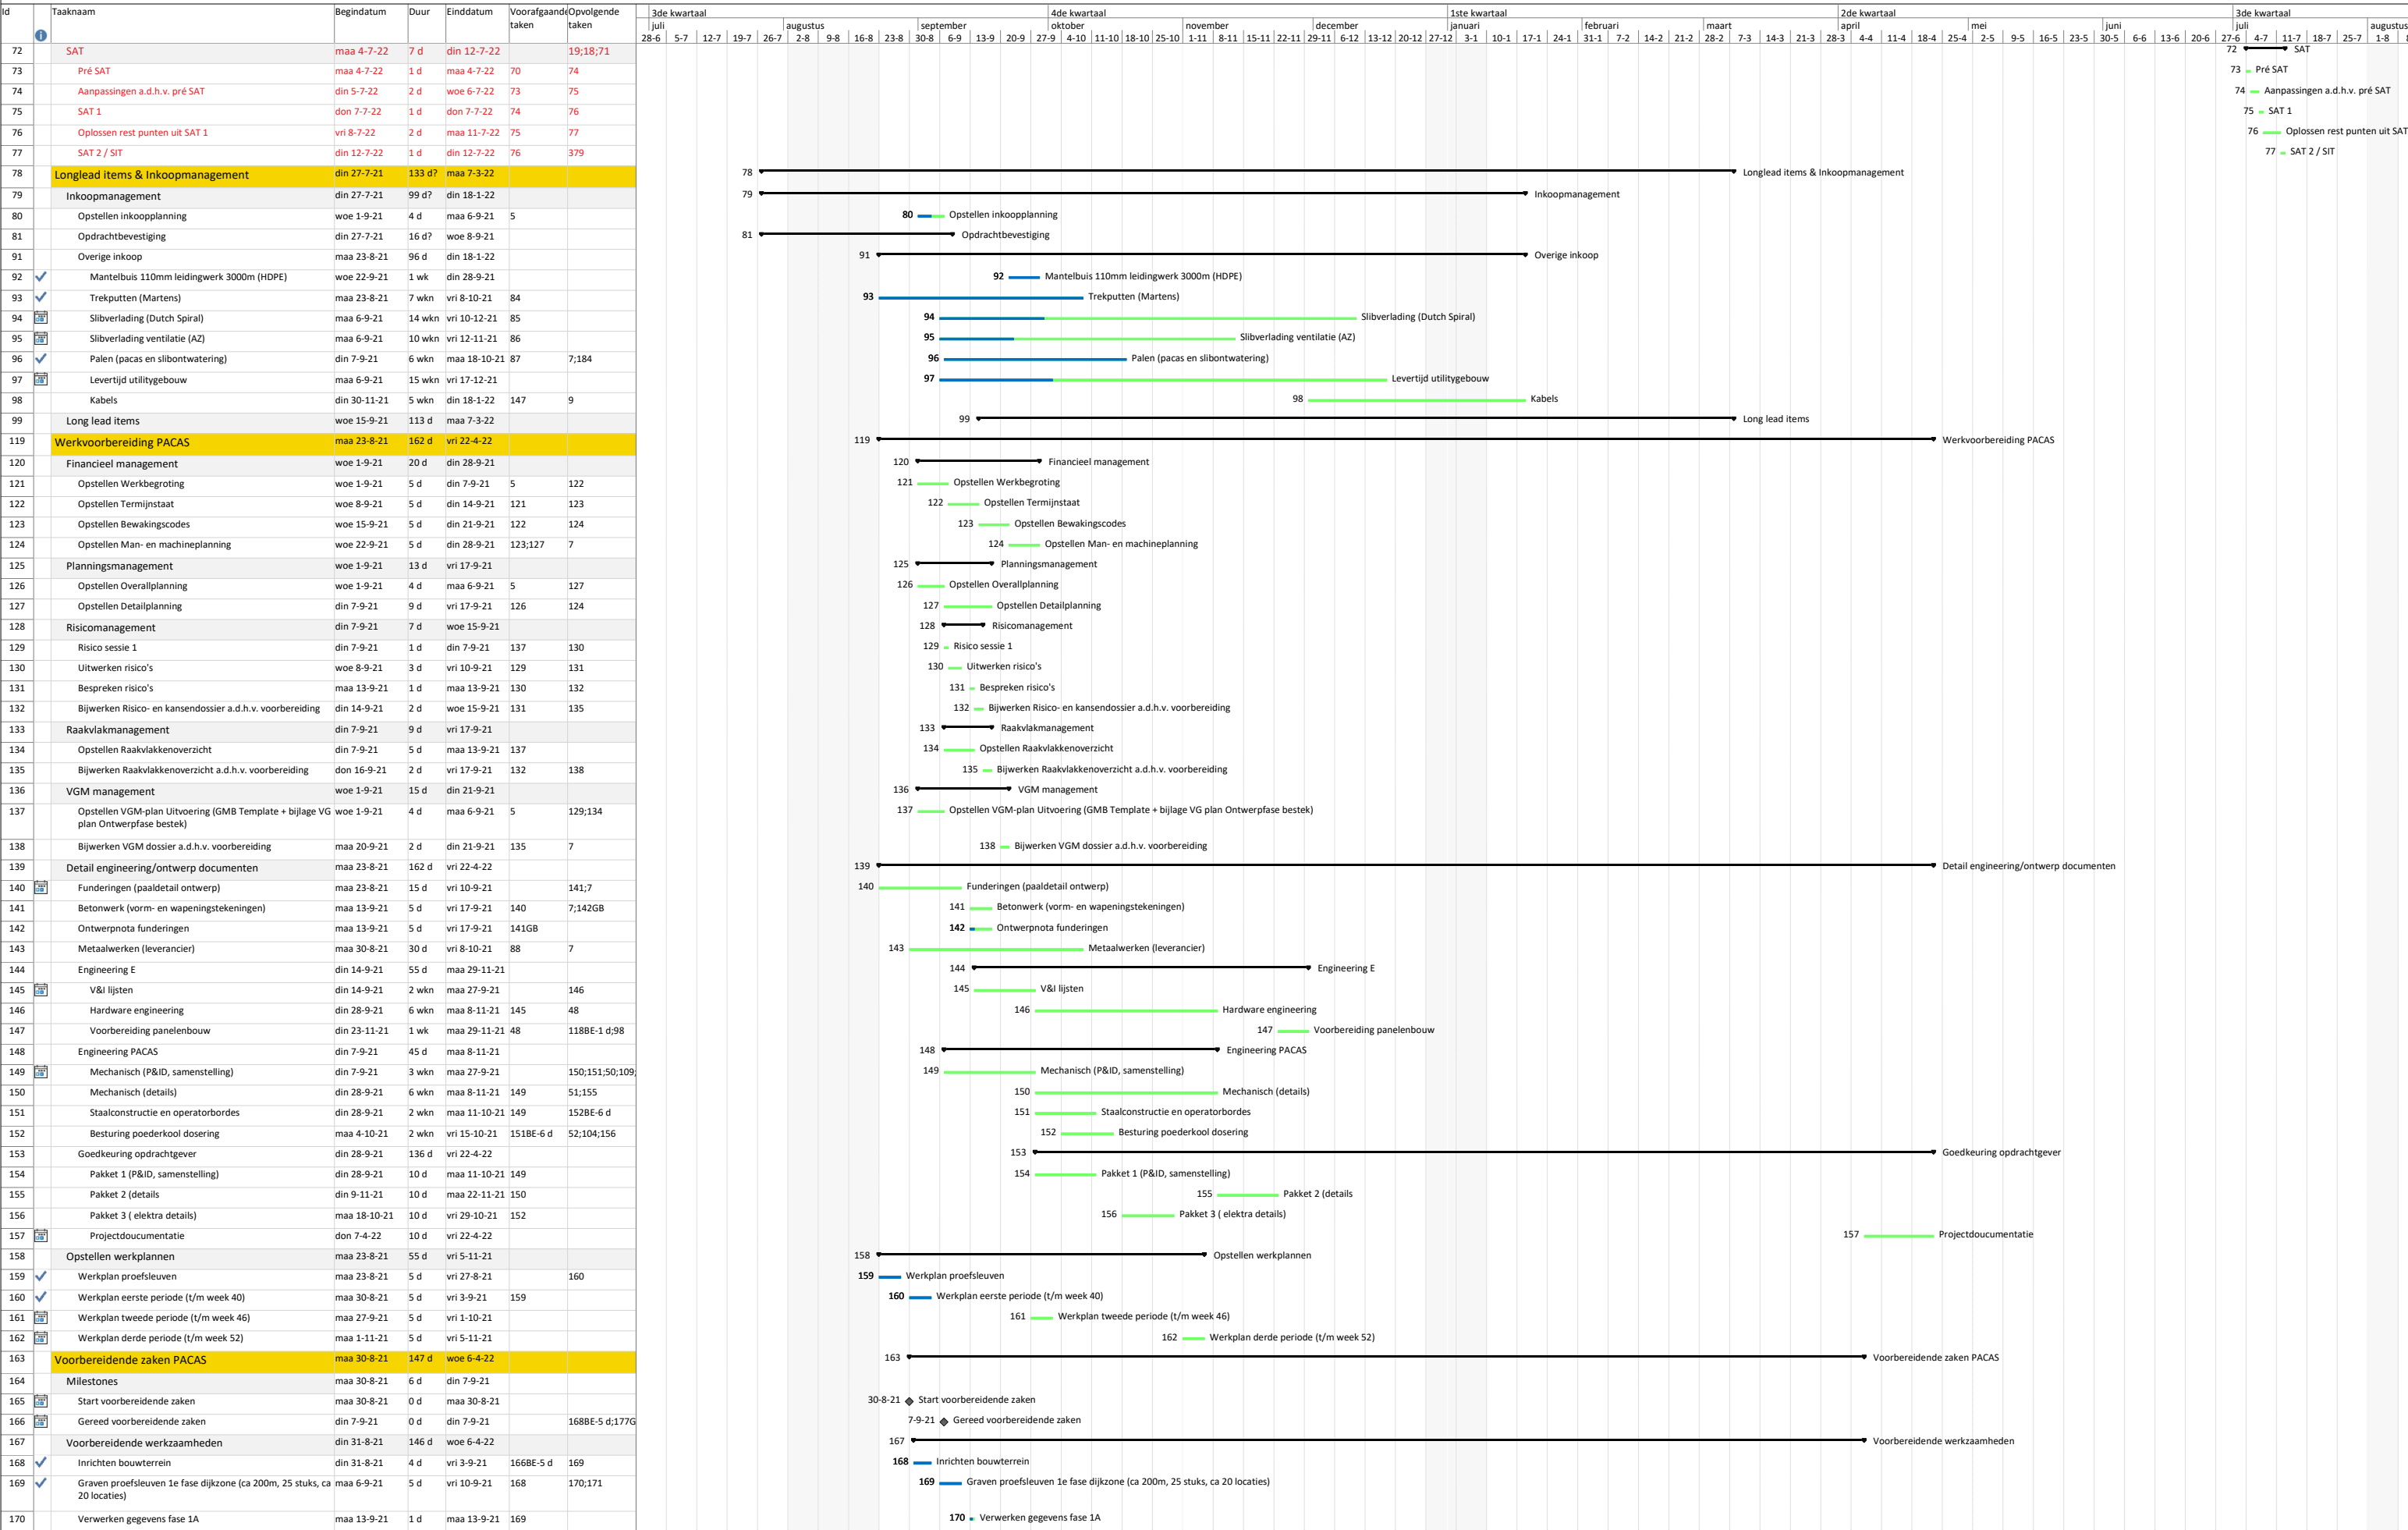

Betreft	:	Realisatie planning	Opdrachtnemer	:	GMB	Voor akkoord, opsteller ON	:	Jan Mens
Opdrachtgever	:	Waterschap Aa en Maas	Documentnummer	:	1000-51351	Voor collegiale toets ON	:	Wesley Ebbeng
Contractnummer	:		Revisie	:	3.0	Voor vrijgave namens ON	:	Adrie Gijlam

Taaknaam	Begindatum	Duur	Einddatum	Voorafgaand taken	Opvolgende taken
243	Montage PACAS installatie	woe 9-2-22	30 d	din 22-3-22	
244	Opslagsilo en accessoires	woe 9-3-22	3 d	vri 11-3-22	58;222
245	Uitdraag apparatuur	woe 9-2-22	5 d	din 15-2-22	241
246	L-I-W feeders	woe 16-2-22	2 d	don 17-2-22	245
247	Leidingwerk PACAS gebouw	woe 16-2-22	15 d	din 8-3-22	245
248	Perslucht systeem	vri 18-2-22	10 d	don 3-3-22	246
249	Ruimte verwarming en ventilatie	vri 4-3-22	3 d	din 8-3-22	248
250	Bekabeling (aansluiten)	woe 9-3-22	10 d	din 22-3-22	247
251	Overige installatie onderdelen	woe 15-12-21	26 d	don 3-2-22	
252	Hijsvoorziening	woe 15-12-21	2 d	don 16-12-21	214
253	Ventilatie, koeling en verwarming	don 23-12-21	3 d	din 11-1-22	216
254	PAC industriële stofzuiger	woe 12-1-22	2 d	don 13-1-22	253
255	Werkhaspel	woe 2-2-22	2 d	don 3-2-22	239
256	Betonwerk Slibverlading	vri 12-11-21	22 d	maa 13-12-21	
257	Balken	vri 12-11-21	13 d	din 30-11-21	
258	Werkvloer	vri 12-11-21	2 d	maa 15-11-21	200
259	Wapening	din 16-11-21	3 d	don 18-11-21	258
260	Bekisting	vri 19-11-21	2 d	maa 22-11-21	259
261	In te storten onderdelen	din 23-11-21	2 d	woe 24-11-21	260
262	Storten & afwerken	don 25-11-21	1 d	don 25-11-21	261
263	Uitharden	vri 26-11-21	2 d	maa 29-11-21	262
264	Ontkisten	din 30-11-21	1 d	din 30-11-21	263
265	Vloer	din 30-11-21	10 d	maa 13-12-21	
266	Aanvullen tussen de balken	din 30-11-21	1 d	din 30-11-21	210
267	Werkvloer	woe 1-12-21	1 d	woe 1-12-21	266
268	Wapening	don 2-12-21	2 d	vri 3-12-21	267
269	Bekisting	maa 6-12-21	1 d	maa 6-12-21	268
270	In te storten onderdelen	din 7-12-21	2 d	woe 8-12-21	269
271	Storten & afwerken	don 9-12-21	1 d	don 9-12-21	270
272	Uitharden	vri 10-12-21	1 d	vri 10-12-21	271
273	Ontkisten	maa 13-12-21	1 d	maa 13-12-21	272
274	Montage Slibverlading	maa 13-12-21	69 d	vri 1-4-22	28
275	Geurbehandeling (AZ techniek)	maa 13-12-21	8 wkn	maa 21-2-22	272
276	Voorbereidende werkzaamheden eletrotechniek	maa 24-1-22	0 wkn	maa 24-1-22	275GE-20 d
277	kabelwegen en bekabeling	din 25-1-22	15 d	maa 14-2-22	276
278	ombouw E-kast	din 15-2-22	5 d	maa 21-2-22	277
279	Opbouw tijdelijke slibontwatering	maa 7-2-22	5 d	vri 11-2-22	30GB
280	bedrijfsvoering tijdelijke ontwatering	maa 14-2-22	6 wkn	vri 25-3-22	279
281	afbraak tijdelijke ontwatering	maa 28-3-22	5 d	vri 1-4-22	280
282	vervangen motoren en reductors (DS)	maa 14-2-22	5 d	vri 18-2-22	279
283	Aansluiten E motoren (HOP)	maa 21-2-22	2 d	din 22-2-22	282
284	vervangen slib transportschroeven (DS)	maa 21-2-22	10 d	vri 4-3-22	282
285	Aansluiten E slibtransportschroeven (HOP)	maa 7-3-22	2 d	din 8-3-22	284
286	Plaatsen afzuigkap (DS)	woe 9-3-22	5 d	din 15-3-22	285
287	Aansluiten afzuigkap (AZ)	woe 16-3-22	5 d	din 22-3-22	286
288	Afwerking doorvoeren	woe 23-3-22	3 d	vri 25-3-22	287
289	Utility gebouw	din 27-7-21	142 d	vri 18-3-22	
290	Milestones	din 27-7-21	142 d	vri 18-3-22	
291	Start	din 27-7-21	0 d	din 27-7-21	
292	Gereed	vri 18-3-22	0 d	vri 18-3-22	314;309
293	Prefab beton	woe 1-12-21	2 d	don 2-12-21	
294	Plaatsen Utility gebouw	woe 1-12-21	1 d	woe 1-12-21	211
295	Afwerken	don 2-12-21	1 d	don 2-12-21	294
296	Gevelfafwerking	vri 3-12-21	21 d	maa 17-1-22	
297	Gevel bekleding	vri 3-12-21	4 d	woe 8-12-21	295
298	Productie zetwerk	don 9-12-21	10 d	woe 22-12-21	297
299	Aanbrengen zetwerk	don 23-12-21	5 d	don 13-1-22	298
300	Deuren en ramen	vri 14-1-22	2 d	maa 17-1-22	299
301	Vloerafwerking	din 18-1-22	11 d	din 1-2-22	
302	Schoonmaken vloer	din 18-1-22	2 d	woe 19-1-22	300
303	uitharden/ontvochtigen	don 20-1-22	5 d	woe 26-1-22	302
304	Aanbrengen coating	don			

Taaknaam	Begindatum	Duur	Einddatum	Voorafgaand taken	Opvolgende taken
				3de kwartaal juli 28-6 5-7 12-7 19-7 26-7 augustus 2-8 9-8 16-8 23-8 september 30-8 6-9 13-9 20-9 27-9 4de kwartaal oktober 4-10 11-10 18-10 25-10 november 1-11 8-11 15-11 22-11 december 29-11 6-12 13-12 20-12 27-12 1ste kwartaal januari 3-1 10-1 17-1 24-1 februari 31-1 7-2 14-2 21-2 maart 28-2 7-3 14-3 21-3 2de kwartaal april 28-3 4-4 11-4 18-4 mei 25-4 2-5 9-5 16-5 23-5 juni 30-5 6-6 13-6 20-6 27-6 3de kwartaal juli 4-7 11-7 18-7 25-7 augustus 1-8 8-8 15-8 22-8 29-8	
315 Doseerleidingen	maa 27-9-21	182 d	woe 29-6-22		
316 Milestones	woe 6-4-22	56 d	woe 29-6-22		
317 Start Fase 1B en 2	woe 6-4-22	0 d	woe 6-4-22	174GB	6
318 Gereed	woe 29-6-22	0 d	woe 29-6-22	337;338;353;	15
319 Trekputten / terreinleidingen	maa 27-9-21	156 d	don 19-5-22		
320 Fase 1a (8 stuks trekputten)	maa 27-9-21	5 d	vri 1-10-21		
321 Vrijgraven putten	maa 27-9-21	2 d	din 28-9-21		322GB;327GB
322 Aanbrengen drainage	maa 27-9-21	2 d	din 28-9-21	321GB	323BE-1 d
323 Aanvullen met drainzand	din 28-9-21	2 d	woe 29-9-21	322BE-1 d	324BE-1 d
324 Plaatsen trekputten	woe 29-9-21	2 d	don 30-9-21	323BE-1 d	325BE-1 d
325 Aanvullen putten	don 30-9-21	2 d	vri 1-10-21	324BE-1 d	318
326 Mantelbuizen fase 1a (300m1)	maa 27-9-21	13 d	woe 13-10-21		
327 Vrijgraven tracé	maa 27-9-21	10 d	vri 8-10-21	321GB	328BE-8 d
328 Aanbrengen mantelbuizen	woe 29-9-21	10 d	din 12-10-21	327BE-8 d	329BE-5 d
329 Aanvullen mantelbuizen	woe 6-10-21	6 d	woe 13-10-21	328BE-5 d	
330 Fase 2 (11 stuks trekputten)	maa 4-4-22	13 d	vri 22-4-22		
331 Vrijgraven putten	maa 4-4-22	5 d	vri 8-4-22	10BE+1 d	332BE-3 d
332 Aanbrengen drainage	woe 6-4-22	5 d	din 12-4-22	331BE-3 d	333BE-3 d
333 Aanvullen met drainzand	vri 8-4-22	5 d	don 14-4-22	332BE-3 d	334BE-3 d
334 Plaatsen trekputten	din 12-4-22	5 d	woe 20-4-22	333BE-3 d	335BE-3 d
335 Aanvullen putten	don 14-4-22	5 d	vri 22-4-22	334BE-3 d	318;337
336 Mantelbuizen fase 2 (2200m1)	maa 25-4-22	13 d	woe 11-5-22		
337 Vrijgraven tracé	maa 25-4-22	10 d	vri 6-5-22	335	318;338BE-8 d
338 Aanbrengen mantelbuizen	woe 27-4-22	10 d	din 10-5-22	337BE-8 d	318;339BE-5 d
339 Aanvullen mantelbuizen	woe 4-5-22	6 d	woe 11-5-22	338BE-5 d	341
340 Fase 1b (7 stuks trekputten)	don 12-5-22	6 d	don 19-5-22		
341 Vrijgraven putten	don 12-5-22	2 d	vri 13-5-22	339	342BE-1 d
342 Aanbrengen drainage	vri 13-5-22	2 d	maa 16-5-22	341BE-1 d	343BE-1 d
343 Aanvullen met drainzand	maa 16-5-22	2 d	din 17-5-22	342BE-1 d	344BE-1 d
344 Plaatsen trekputten	din 17-5-22	2 d	woe 18-5-22	343BE-1 d	345BE-1 d
345 Aanvullen putten	woe 18-5-22	2 d	don 19-5-22	344BE-1 d	347
346 Mantelbuizen fase 1b (500m1) 4 locaties	vri 20-5-22	14 d	maa 13-6-22		
347 Vrijgraven tracé	vri 20-5-22	10 d	din 7-6-22	345	348BE-7 d
348 Aanbrengen mantelbuizen	woe 25-5-22	10 d	vri 10-6-22	347BE-7 d	349BE-4 d
349 Aanvullen mantelbuizen	din 7-6-22	5 d	maa 13-6-22	348BE-4 d	351;355
350 Doseerleidingen naar BC1	din 14-6-22	8 d	don 23-6-22		
351 Invoeren doseerleidingen	din 14-6-22	2 d	woe 15-6-22	349	352
352 Koppelen leidingen in trekputten	don 16-6-22	3 d	maa 20-6-22	351	353
353 Aanbrengen doseerpunten	din 21-6-22	3 d	don 23-6-22	352	318;359
354 Doseerleidingen naar BC2	din 14-6-22	10 d	maa 27-6-22		
355 Invoeren doseerleidingen	din 14-6-22	2 d	woe 15-6-22	349	356
356 Koppelen leidingen in trekputten	don 16-6-22	5 d	woe 22-6-22	355	357
357 Aanbrengen doseerpunten	don 23-6-22	3 d	maa 27-6-22	356	318;360
358 Testen	vri 24-6-22	4 d	woe 29-6-22		
359 Druktest doseerleidingen BC1	vri 24-6-22	2 d	maa 27-6-22	353	318
360 Druktest doseerleidingen BC2	din 28-6-22	2 d	woe 29-6-22	357	318;70;379
361 Terreinafwerking	woe 3-11-21	100 d	woe 6-4-22		
362 Funderingen	woe 3-11-21	12 d	don 18-11-21		
363 Graven cunet	woe 3-11-21	5 d	din 9-11-21	181BE+30 d;1364	
364 Aanbrengen mantelbuizen	woe 10-11				
