


	Name	Duration	Start	Finish	Resource Names	Work	14 Jun 15							21 Jun 15							28 Jun 15							5 Jul 15							12 Jul 15							19
							T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S		
1	<input checked="" type="checkbox"/> Host besturing Land van Cuijk	70 days	6/12/15 8:00 AM	9/17/15 5:00 PM		301 hours																																				
2	<input checked="" type="checkbox"/> Ontvangst documenten en software	0.125 days	6/12/15 8:00 AM	6/12/15 9:00 AM	M. Jorjaan	1 hour																																				
3	Planning	0.5 days	6/15/15 8:00 AM	6/15/15 1:00 PM	M. Jorjaan	4 hours																																				
4	<input checked="" type="checkbox"/> Functioneel ontwerp Opjager M	14 days	6/18/15 8:00 AM	7/7/15 5:00 PM		80 hours																																				
5	FO Prognose Opjager Mill	12 days	6/18/15 8:00 AM	7/3/15 5:00 PM	M. Jorjaan[33%]	32 hours																																				
6	Goedkeuring FO Prognose	1 day	7/7/15 8:00 AM	7/7/15 5:00 PM	M. Jorjaan	8 hours																																				
7	FO Host Opjager Mill	12 days	6/18/15 8:00 AM	7/3/15 5:00 PM	M. Jorjaan[33%]	32 hours																																				
8	Goedkeuring FO Host	1 day	7/7/15 8:00 AM	7/7/15 5:00 PM	M. Jorjaan	8 hours																																				
9	<input checked="" type="checkbox"/> Software Opjager Mill	17.625 days	7/14/15 11:00 AM	8/6/15 5:00 PM		96 hours																																				
10	<input checked="" type="checkbox"/> Software Prognose Opjager M	8.625 days	7/14/15 11:00 AM	7/24/15 5:00 PM		48 hours																																				
11	PLC Prognose Opjager Mill	6 days	7/14/15 11:00 AM	7/22/15 11:00 AM	M. Jorjaan[50%]	24 hours																																				
12	SCADA Prognose Opjager Mill	6 days	7/17/15 8:00 AM	7/24/15 5:00 PM	M. Jorjaan[50%]	24 hours																																				
13	<input checked="" type="checkbox"/> Software Host Opjager Mill	9 days	7/27/15 8:00 AM	8/6/15 5:00 PM		48 hours																																				
14	PLC Host Opjager Mill	6 days	7/27/15 8:00 AM	8/3/15 5:00 PM	M. Jorjaan[50%]	24 hours																																				
15	SCADA Host Opjager Mill	6 days	7/30/15 8:00 AM	8/6/15 5:00 PM	M. Jorjaan[50%]	24 hours																																				
16	Functionele test Opjager Mill	10 days	8/10/15 8:00 AM	8/21/15 5:00 PM	M. Jorjaan[40%]	32 hours																																				
17	FAT Opjager Mill	5 days	8/31/15 8:00 AM	9/4/15 5:00 PM	M. Jorjaan	40 hours																																				
18	SAT Host Land van Cuijk	2 days	9/7/15 4:00 PM	9/9/15 4:00 PM	M. Jorjaan	16 hours																																				
19	As build documentatie	3 days	9/14/15 8:00 AM	9/16/15 5:00 PM	M. Jorjaan	24 hours																																				
20	Oplevering	1 day	9/17/15 8:00 AM	9/17/15 5:00 PM	M. Jorjaan	8 hours																																				

D			project: Host Land van Cuijk
C			
B			
A	18-2-14	MJO	tekeningnummer:
rev.	datum	gec.	projectnummer:



Diagram
Planning Opjager Mill

getekend:	MJO	formaat:	A3
gecontroleerd:	MJO		
schaal:	n.v.t.		
filenaam:	Planning Prognose en Host Oplager Mill.pdf		
nummer:	Planning Page 1 of 2		

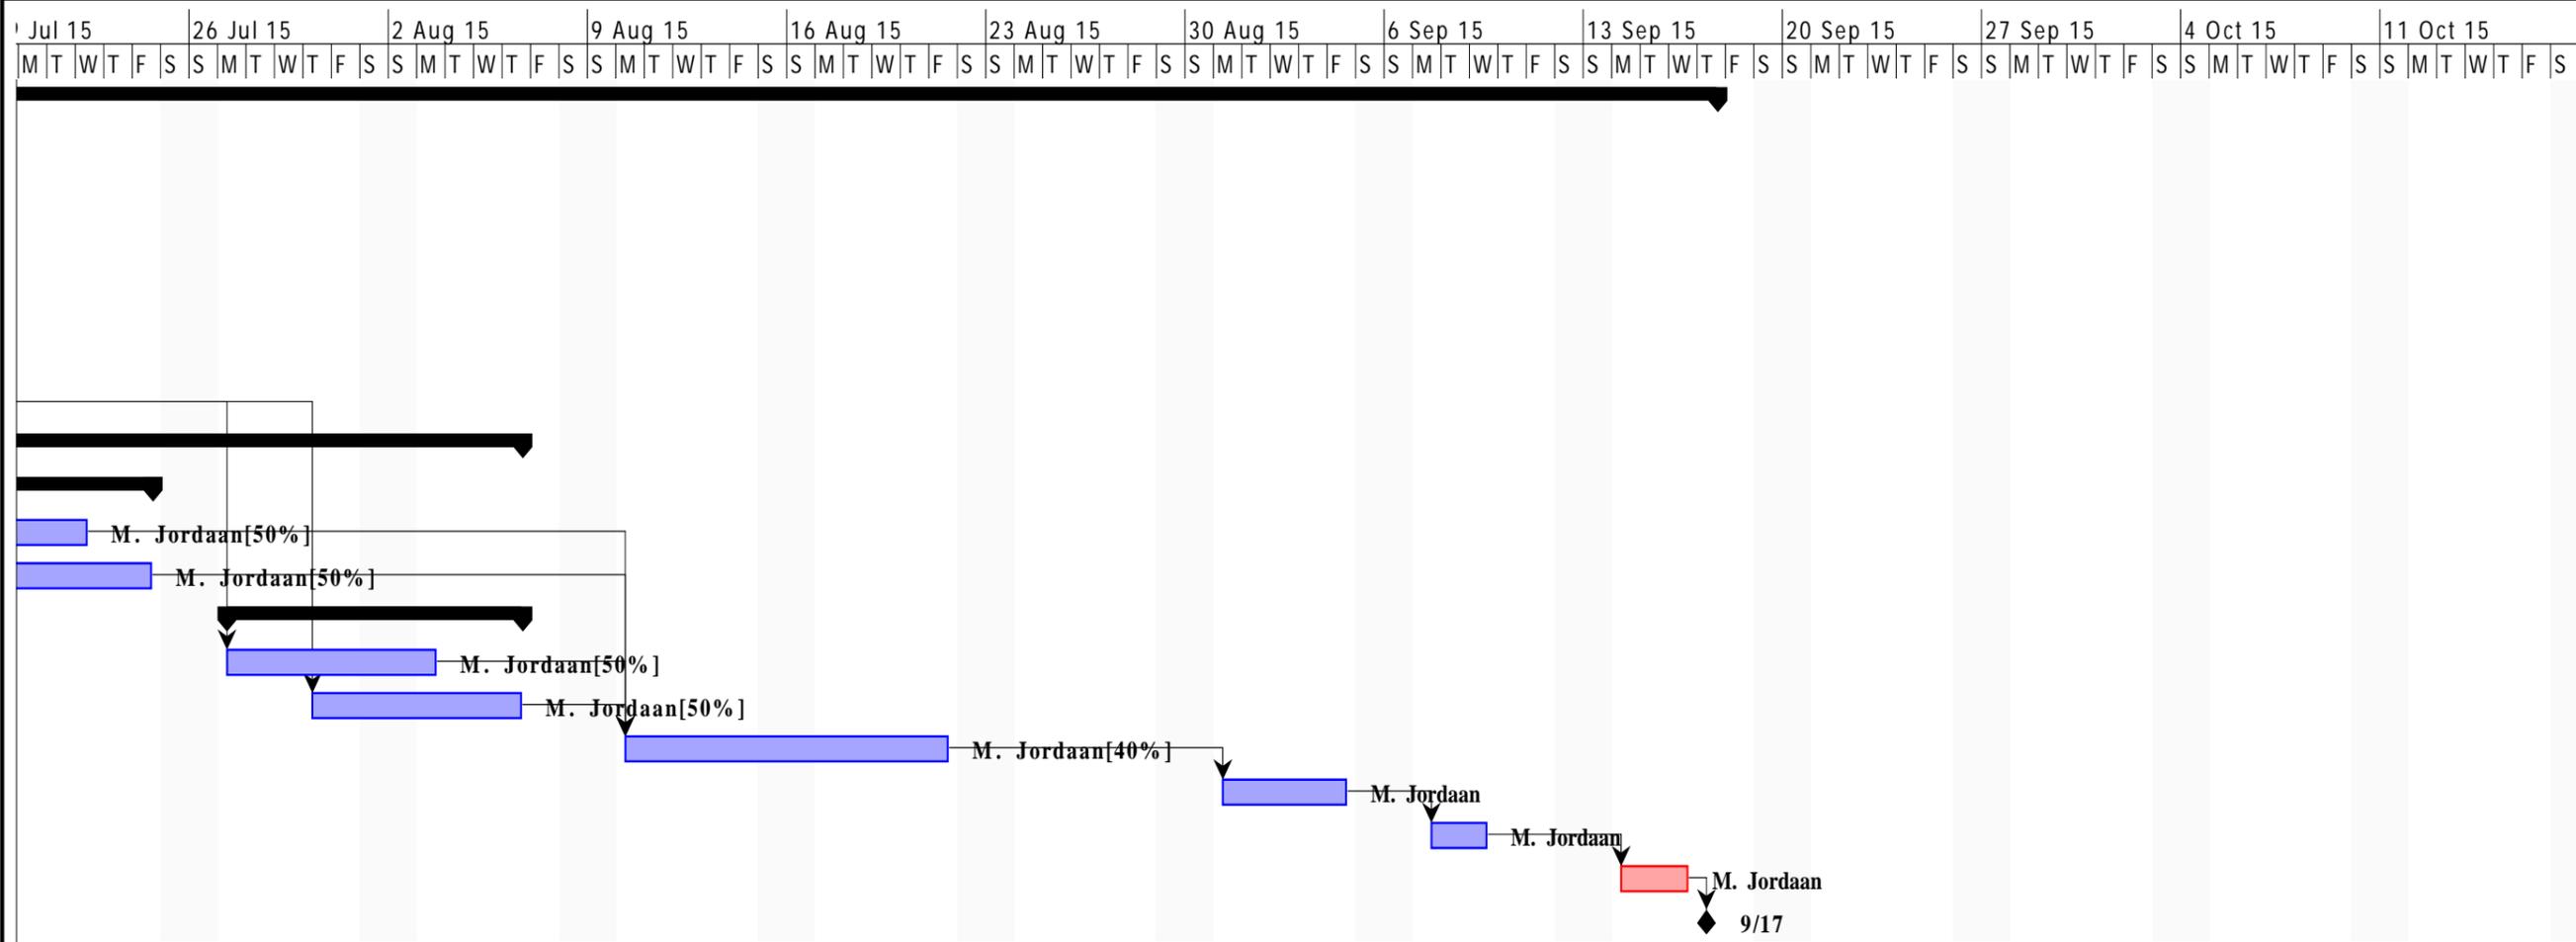

D			project: Host Land van Cuijk
C			
B			
A	18-2-14	MJO	tekeningnummer:
rev.	datum	gec.	projectnummer:



Diagram
Planning Opjager Mill

getekend:	MJO	formaat:	A3
gecontroleerd:	MJO		
schaal:	n.v.t.		
filenaam:	Planning Prognose en Host Oplager Mill.pdf		
nummer:	Planning Page 2 of 2		
