		Name	Duration	Start	Finish	Resource Names	Work
1		**Host besturing Land van Cuijk**	**70 days**	**6/12/15 8:00 AM**	**9/17/15 5:00 PM**		**301 hours**
2		Ontvangst documenten en software	0.125 days	6/12/15 8:00 AM	6/12/15 9:00 AM	M. Jordaan	1 hour
3		Planning	0.5 days	6/15/15 8:00 AM	6/15/15 1:00 PM	M. Jordaan	4 hours
4		**Functioneel ontwerp Opjager Mill**	**14 days**	**6/18/15 8:00 AM**	**7/7/15 5:00 PM**		**80 hours**
5		FO Prognose Opjager Mill	12 days	6/18/15 8:00 AM	7/3/15 5:00 PM	M. Jordaan[33%]	32 hours
6		Goedkeuring FO Prognose	1 day	7/7/15 8:00 AM	7/7/15 5:00 PM	M. Jordaan	8 hours
7		FO Host Opjager Mill	12 days	6/18/15 8:00 AM	7/3/15 5:00 PM	M. Jordaan[33%]	32 hours
8		Goedkeuring FO Host	1 day	7/7/15 8:00 AM	7/7/15 5:00 PM	M. Jordaan	8 hours
9		**Software Opjager Mill**	**17.625 days**	**7/14/15 11:00 AM**	**8/6/15 5:00 PM**		**96 hours**
10		**Software Prognose Opjager Mill**	**8.625 days**	**7/14/15 11:00 AM**	**7/24/15 5:00 PM**		**48 hours**
11		PLC Prognose Opjager Mill	6 days	7/14/15 11:00 AM	7/22/15 11:00 AM	M. Jordaan[50%]	24 hours
12		SCADA Prognose Opjager Mill	6 days	7/17/15 8:00 AM	7/24/15 5:00 PM	M. Jordaan[50%]	24 hours
13		**Software Host Opjager Mill**	**9 days**	**7/27/15 8:00 AM**	**8/6/15 5:00 PM**		**48 hours**
14		PLC Host Opjager Mill	6 days	7/27/15 8:00 AM	8/3/15 5:00 PM	M. Jordaan[50%]	24 hours
15		SCADA Host Opjager Mill	6 days	7/30/15 8:00 AM	8/6/15 5:00 PM	M. Jordaan[50%]	24 hours
16		Functionele test Opjager Mill	10 days	8/10/15 8:00 AM	8/21/15 5:00 PM	M. Jordaan[40%]	32 hours
17		FAT Opjager Mill	5 days	8/31/15 8:00 AM	9/4/15 5:00 PM	M. Jordaan	40 hours
18		SAT Host Land van Cuijk	2 days	9/7/15 4:00 PM	9/9/15 4:00 PM	M. Jordaan	16 hours
19		As build documentatie	3 days	9/14/15 8:00 AM	9/16/15 5:00 PM	M. Jordaan	24 hours
20		Oplevering	1 day	9/17/15 8:00 AM	9/17/15 5:00 PM	M. Jordaan	8 hours

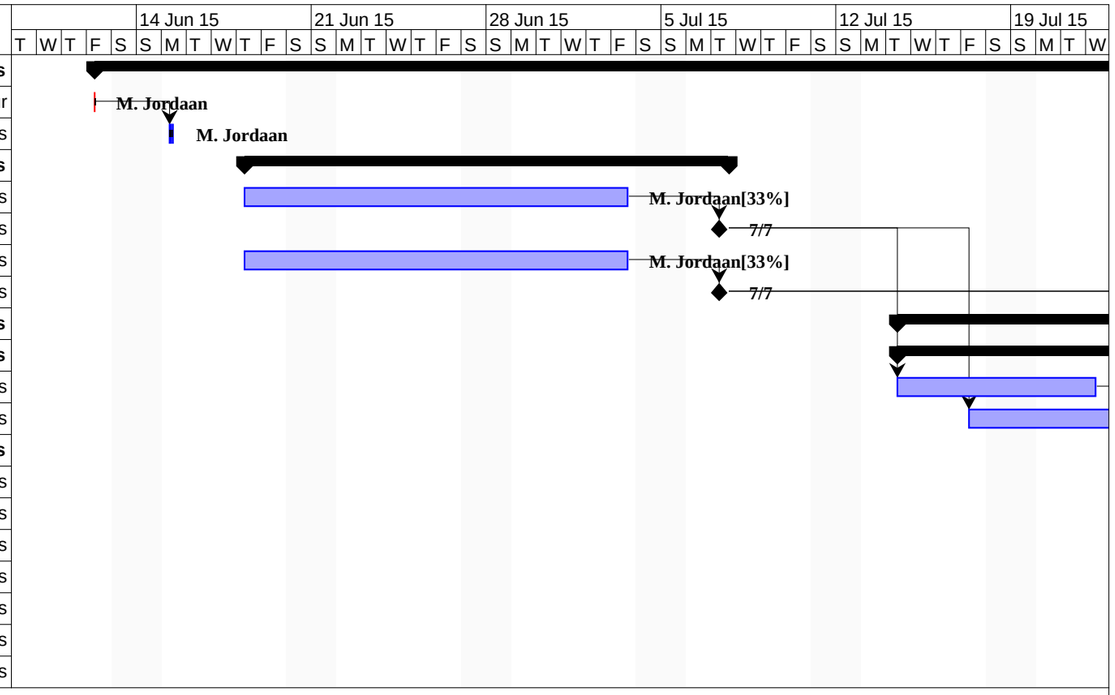

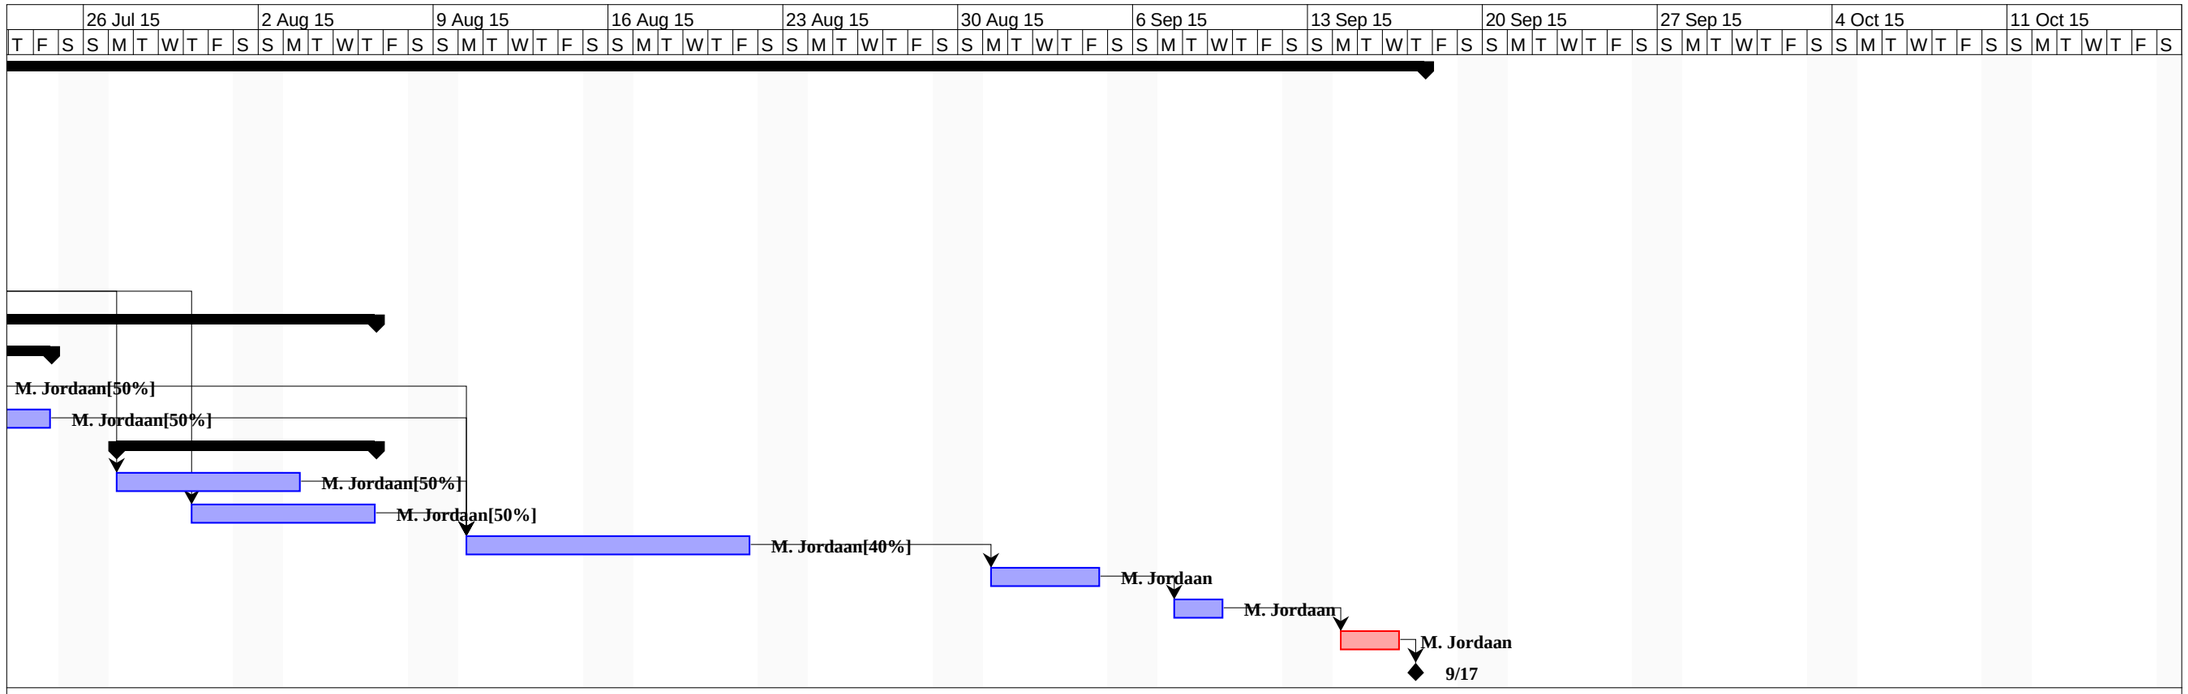
26 Jul 15
2 Aug 15
9 Aug 15
16 Aug 15
23 Aug 15
30 Aug 15
6 Sep 15
13 Sep 15
20 Sep 15
27 Sep 15
4 Oct 15
11 Oct 15
M. Jordaan[50%]
M. Jordaan[50%]
M. Jordaan[50%]
M. Jordaan[50%]
M. Jordaan[40%]
M. Jordaan
M. Jordaan
M. Jordaan
9/17
